



I.B.

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

(AeDES 05/2000)/bis

Codice Richiesta

Be348

SEZIONE 1 Identificazione edificio

Provincia: CANPOBASSO

Comune: TERNOLI

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

Indirizzo

1 via CORSO NAZIONALE

2 corso LE

3 vicolo

4 piazza Num. Civico

5 altro

(Indicare: contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra | | | Scheda n. | | | Data 30/1/02

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. Istat Prov. Istat Comune N° aggregato N° edificio

14 070 078 | | | | |

Cod. di Località Istat

Tipo carta

Sez. di censimento Istat

N° carta

Dati Catastali Foglio 13 Allegato B

Particelle 181 | | | | |

Posizione edificio 1 Isolato 2 Interno 3 D'estremità 4 D'angolo


Denominazione
edificio o proprietario

PALAZZO MURICCHIO

Codice Uso

S

Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio

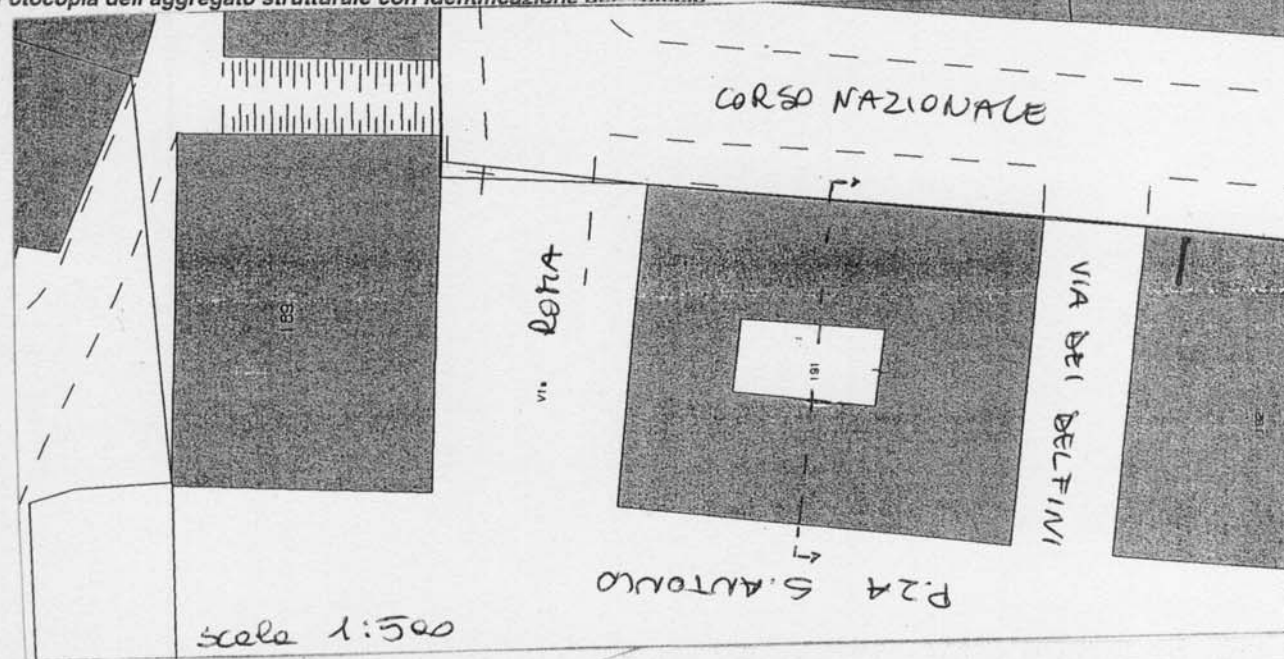

SEZIONE 2 Descrizione edificio

Dati metrici

Età

Uso - esposizione

| N° Piani totali con interrati | Altezza media di piano [m] | Superficie media di piano [m ²] | | Costruzione e ristrutturaz. [max 2] | Uso | N° unità d'uso | Utilizzazione | Occupanti | | |
|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| | | A ≤ 50 | I $400 + 500$ | | | | | 100 | 10 | 1 |
| <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9 | 1 <input type="radio"/> ≤ 2.50 | A <input type="radio"/> ≤ 50 | I <input type="radio"/> $400 + 500$ | 1 <input checked="" type="checkbox"/> ≤ 1919 | A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo | <u>06</u> | A <input checked="" type="checkbox"/> $> 65\%$ | 0 | 0 | 0 |
| <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10 | 2 <input type="radio"/> $2.50 + 3.50$ | B <input type="radio"/> $50 + 70$ | L <input checked="" type="checkbox"/> $500 + 650$ | 2 <input type="checkbox"/> $19 + 45$ | B <input type="checkbox"/> Produttivo | | B <input type="radio"/> $30 + 65\%$ | 1 | 1 | 1 |
| <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11 | 3 <input checked="" type="checkbox"/> $3.50 + 5.0$ | C <input type="radio"/> $70 + 100$ | M <input type="radio"/> $650 + 900$ | 3 <input type="checkbox"/> $46 + 61$ | C <input checked="" type="checkbox"/> Commercio | | C <input type="radio"/> $< 30\%$ | 2 | 2 | 2 |
| <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12 | 4 <input type="radio"/> > 5.0 | D <input type="radio"/> $100 + 130$ | N <input type="radio"/> $900 + 1200$ | 4 <input type="checkbox"/> $62 + 71$ | D <input type="checkbox"/> Uffici | | D <input type="radio"/> Non utilizz. | 3 | 3 | 3 |
| <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12 | | E <input type="radio"/> $130 + 170$ | O <input type="radio"/> $1200 + 1600$ | 5 <input type="checkbox"/> $72 + 81$ | E <input type="checkbox"/> Serv. Pub. | | E <input type="radio"/> In costruz. | 4 | 4 | 4 |
| <input type="radio"/> 6 | Piani interrati | F <input type="radio"/> $170 + 230$ | P <input type="radio"/> $1600 + 2200$ | 6 <input type="checkbox"/> $82 + 91$ | F <input type="checkbox"/> Deposito | | F <input type="radio"/> Non finito | 5 | 5 | 5 |
| <input type="radio"/> 7 | | A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 | G <input type="radio"/> $230 + 300$ | Q <input type="radio"/> $2200 + 3000$ | 7 <input type="checkbox"/> $92 + 01$ | G <input type="checkbox"/> Strategico | | G <input type="radio"/> Abbandon. | 6 | 6 |
| <input type="radio"/> 8 | B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥ 3 | H <input type="radio"/> $300 + 400$ | R <input type="radio"/> > 3000 | 8 <input type="checkbox"/> ≥ 2002 | H <input type="checkbox"/> Turis-ricet. | | | 7 | 7 | 7 |
| | | | | | | Proprietà | | A <input type="radio"/> Pubblica | B <input checked="" type="checkbox"/> Privata | |

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

| Strutture verticali | | Strutture in muratura | | | | | | | | Altre strutture | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | Non identificate | | A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...) | | A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,...) | | Pilastrini isolati | Mista | Rinforzata | Telai in c.a. | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Senza catene o cordoli | Con catene o cordoli | Senza catene o cordoli | Con catene o cordoli | | | | Telai in c. a. | | <input type="checkbox"/> |
| Strutture orizzontali | | A | B | C | D | E | F | G | H | REGOLARITA' | Non regolare | Regolare | |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | | A | B | |
| 1 | Non identificate | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Volte senza catene | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | G1 | H1 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 | Volte con catene | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NO | G2 | H2 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | G3 | H3 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| REGOLARITA' | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Non regolare | Regolare | |
| | A | B | |
| 1 | Forma pianta ed elevazione | <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Disposizione tamponature | <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Copertura

| | |
|---|---|
| 1 | <input type="radio"/> Spingente pesante |
| 2 | <input type="radio"/> Non spingente pesante |
| 3 | <input type="radio"/> Spingente leggera |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> Non spingente leggera |

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

| Livello - estensione | DANNO ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | PROVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI | | | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | D4-D5 Gravissimo | | | D2-D3 Medio grave | | | D1 Leggero | | | Nullo | Nessuno | Demolizioni | Cerchiature e/o tiranti | Riparazione | Puntelli | Trasenne e protezione passaggi |
| | > 2/3 | 1/3 - 2/3 | < 1/3 | > 2/3 | 1/3 - 2/3 | < 1/3 | > 2/3 | 1/3 - 2/3 | < 1/3 | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | A | B | C | D | E | F |
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato campire Nullo.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

| Tipo di danno | PRESENZA DANNO | PROVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | Nessuno | Rimozione | Puntelli | Riparazione | Divieto di accesso | Trasenne e protezione passaggi |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

| Causa potenziale | PERICOLO SU | | | PROVVEDIM. DI P.I. ESEGUITI | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Edificio | Via d'accesso | Vie interne | Divieto di accesso | Trasenne e protez. passaggi |
| | A | B | C | D | E |
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni

| MORFOLOGIA DEL SITO | | | | DISSESTI (in atto o temibili): <input type="checkbox"/> Versanti incombenti <input checked="" type="checkbox"/> Terreno di fondazione | | | |
|---------------------|------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | <input type="radio"/> Cresta | 2 | <input type="radio"/> Pendio forte | 3 | <input type="radio"/> Pendio leggero | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> Pianura |
| | | | | A | <input type="radio"/> Assenti | B | <input type="radio"/> Generati dal sisma |
| | | | | C | <input type="radio"/> Acuiti dal sisma | D | <input checked="" type="checkbox"/> Preesistenti |

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità

| Valutazione del rischio | | | | | Esito di agibilità | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| RISCHIO | STRUTTURALE (Sez. 3 e 4) | NON STRUTTURALE (Sez. 5) | ESTERNO (sez. 6) | GEOTECNICO (sez. 7) | | |
| BASSO | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | A Edificio AGIBILE | <input type="radio"/> |
| BASSO CON PROVVEDIMENTI | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1) | <input type="radio"/> |
| ALTO | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1) | <input checked="" type="radio"/> |
| | | | | | D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento | <input type="radio"/> |
| | | | | | E Edificio INAGIBILE | <input type="radio"/> |
| | | | | | F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (1) | <input type="radio"/> |

(1) riportare nella colonna argomento della Sez. 9 l'esito e nelle annotazioni le parti di edificio inagibili (esiti B, C) e le cause di rischio esterno (esito F)

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Sull'accuratezza della visita | 1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno | 4 <input type="radio"/> Non eseguito per: | a <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR) | b <input type="radio"/> Rudere (RU) | c <input type="radio"/> Demolito (DM) |
| | 2 <input checked="" type="radio"/> Parziale | | d <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT) | e <input type="radio"/> Altro (AL) | |
| | 3 <input type="radio"/> Completa (> 2/3) | | | | |

Provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

| * | ** | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI | * | ** | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI |
|---|--------------------------|---|----|-------------------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Messa in opera di cerchiature o tiranti | 7 | <input type="checkbox"/> | Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi | 8 | <input type="checkbox"/> | Rimozione di altri oggetti interni o esterni |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Riparazione copertura | 9 | <input type="checkbox"/> | Transennature e protezione passaggi |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Puntellatura di scale | 10 | <input type="checkbox"/> | Riparazioni delle reti degli impianti |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature | 11 | <input checked="" type="checkbox"/> | Puntellamento archi |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Rimozione di tegole, cornicioni, parapetti | 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | Riparazione lesioni |

Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili Nuclei familiari evacuati N° persone evacuate

SEZIONE 9 Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

| Argomento | Annotazioni | Foto d'insieme dell'edificio | spilla |
|-----------|--|------------------------------|---|
| | <p>Il sopralluogo è stato effettuato solo nella parte sinistra (rispetto all'ingresso principale) relative alla proprietà Municipale di via Del Golfo Terese - I vani da danno in via dei Delfini presentano lesioni sulle volte interne, sulle murature perimetrali con qualche rigonfiamento del perimetro - Sulla porta comunicante tra due Marche è presente una rilevante lesione con cadute di intonaci che necessita di puntellamenti. Anche sull'esterno sono presenti lesioni sugli elementi in pietra delle aperture - lo stato di dissesto presente è imputabile a problemi di cedimento del terreno di fondazione, ma è stato appurato dell'esito sicuro che ha causato distacco di elementi di muratura e intonaco</p> <p>DATTILIO RICCARDO</p> | | |
| | <p>Il compilatore (in stampatello) VALENTE CLEMENTE MORELLI MARIA A. DE VECCHIS VERONICA</p> | | <p>Firma [Firma]</p> |
